

Informationen zum Rückbau des Temporären Reservekraftwerks - Juli 2026


10. Juli 2026

Information der GE Vernova über die Rückbauphase der Anlage TRPP Birr - Juli 2026

Der Rückbau der Anlage TRPP Birr begann am 1. Mai 2026 und wird voraussichtlich Ende Dezember 2026 abgeschlossen sein.

Die Abbrucharbeiten der TRPP-Anlage verlaufen planmässig und entsprechend dem Abbruchzeitplan. Der Gesamtfortschritt der Abbrucharbeiten ist nachstehend nach Zonen aufgeschlüsselt dargestellt.

Lageplan Zonen 1 – 4 der Rückbauaktivitäten der TRPP Birr Anlage

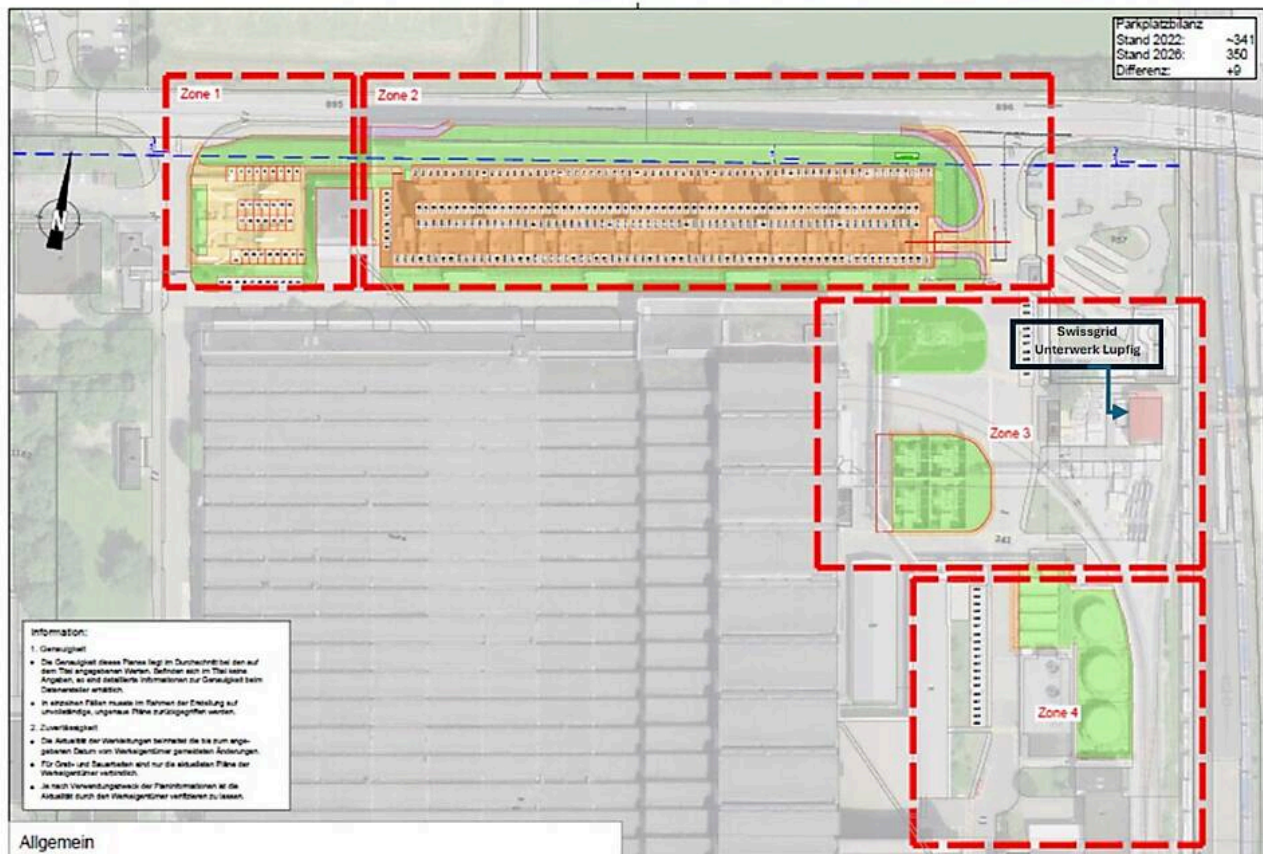

In Zone 1, Wasseraufbereitungsanlage, ist der Rückbau der mechanischen und elektrischen Anlagen abgeschlossen. Ausstehend ist der Abriss der Betonfundamente.

In Zone 2, Gas-Turbinen-Generatoren Einheiten, ist der Rückbau der mechanischen und elektrischen Anlagen zu 70% abgeschlossen. Die Gasturbinenmodule 2, 7 und 8 wurden abtransportiert. Alle Kamine der Gasturbinen mit Ausnahme der Kamine 5 und 6 wurden abgebaut.

Temporäre Verkehrsregelungen im Bereich der Zonen 1 & 2 (Lärmschutzwand)

- Der Abbau der Lärmschutzwandabschnitte wird voraussichtlich zwischen den Kalenderwochen 30 und 36/2026 stattfinden. Während die Betonelemente abgehoben werden, wird der Gehweg vom Sicherheitspersonal vorübergehend für Fußgänger geregelt. Sobald der Hebekran die Sicherheitszone für die Entsorgung der Betonplatten erreicht hat, wird der Gehweg für Fussgänger wieder freigegeben.
- Die vorübergehende Verkehrsumleitung (Strassen-Verengung) im Zonenbereich 1&2 entlang der Schallschutzwand, wird voraussichtlich in der Kalenderwoche 32/2026 eingerichtet und bis zum vollständigen Abbau der Lärmschutzwand bestehen bleiben. Gemäß dem Projektzeitplan sollen diese Abbauarbeiten in der Kalenderwoche 45/2026 abgeschlossen sein.

In der Zone 3, Transformatoren, ist der Rückbau der mechanischen und elektrischen Anlagen zur 15 % abgeschlossen. Alle Hochspannungsleitungen auf Primär- und Sekundärseite sind demontiert und die Transformatoren sind vorbereitet, um demontiert und abtransportiert zu werden.

In der Zone 3, Swissgrid Unterwerk Lupfig, ist der Rückbau der mechanischen und elektrischen Anlagen zur 40 % abgeschlossen. Alle Hochspannungsleitungen von den Transformatoren zu den Lastschaltern der Swissgrid sind demontiert, inklusive der Stahlkabelbrücken. Die Hochspannungseinspeisung im Ansaldo-Areal wurde in den Zustand vor dem Bau des TRPP wiederhergestellt.

In der Zone 4, Flüssig-Brennstoff-Reservoirs und der Ölförderanlagen, ist der Rückbau der mechanischen und elektrischen Anlagen zur 70 % abgeschlossen. Alle Ölleitungen und die 3 Tanks sind gereinigt worden und die Parker-Module (zur Ölaufbereitung) wurden entfernt.

[Informationsblatt Rückbauphase TRPP Birr - Juli 2026 \[pdf, 1.8 MB\]](#)

Die Projektleitung der TRPP Birr Anlage steht Ihnen für Fragen zu diesen Rückbau-Aktivitäten zur Verfügung und kann wie folgt kontaktiert werden:

GE Vernova, Projektleitung

Zentralstrasse 40

5242 Birr

René Schertenleib

Tel. 058 505 71 12
