

Informationen zum Rückbau des Temporären Reservekraftwerks - August 2026


14. August 2026

Information der GE Vernova über die Rückbauphase der Anlage TRPP Birr - August 2026

Der Rückbau der Anlage TRPP Birr begann am 1. Mai 2026 und wird voraussichtlich Ende Dezember 2026 abgeschlossen sein.

Die Abbrucharbeiten der TRPP-Anlage verlaufen planmässig und entsprechend dem Abbruchzeitplan. Der Gesamtfortschritt der Abbrucharbeiten ist nachstehend nach Zonen aufgeschlüsselt dargestellt.

Lageplan Zonen 1 – 4 der Rückbauaktivitäten der TRPP Birr Anlage

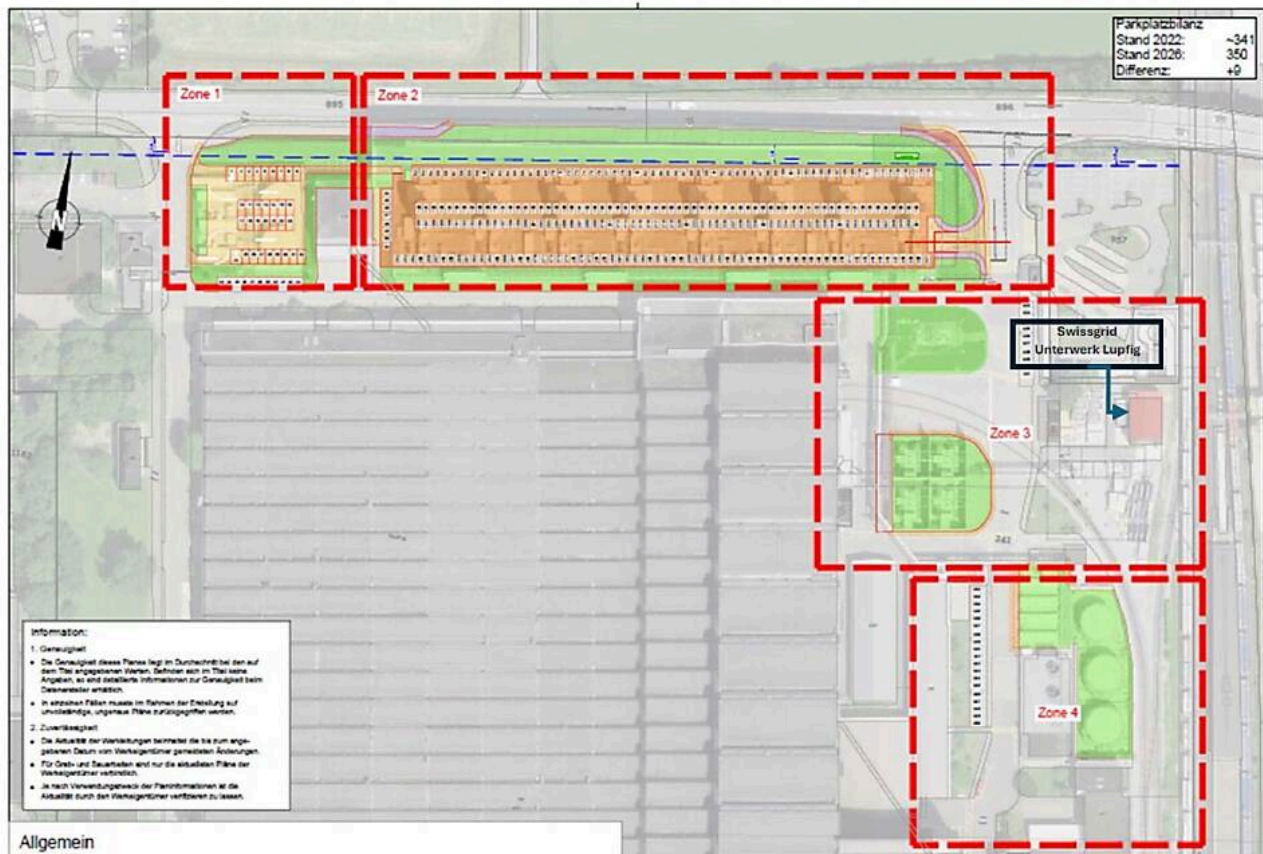

In Zone 1, Wasseraufbereitungsanlage, wurden die Beton-Fundamenten via Presslufthammer zerkleinert und entfernt. Diese Arbeiten sind gemäss Projektterminplan in dieser Zone bis Mitte August abgeschlossen.

In Zone 2, Gas-Turbinen-Generatoren Einheiten, ist der Rückbau der mechanischen und elektrischen Anlagen abgeschlossen. Die insgesamt 8 Gasturbinen Einheiten wurden von dieser Zone entfernt und abtransportiert.

Temporäre Verkehrsregelungen im Bereich der Zonen 1 & 2 (Lärmschutzwand)

- Die vorübergehende Verkehrsumleitung (Strassen-Verengung) im Zonenbereich 1 und 2 entlang der Schallschutzwand, wurde in der Kalenderwoche 31 / 2026 eingerichtet und wird bis zum vollständigen Abbau der Lärmschutzwand bestehen bleiben. Gemäss dem Projektzeitplan sollen diese Abbauarbeiten in der Kalenderwoche 45 / 2026 abgeschlossen sein.
- Der Abbau der Lärmschutzwandabschnitte (Betonplatten und Stahlträger) ist zu 50 % abgeschlossen. Gemäss dem vorgesehenen Zeitplan wird der vollständige Abbau der Lärmschutzwandelemente in der 34. Kalenderwoche / 2026 abgeschlossen sein.

In Zone 3

- Im Transformatorenbereich ist der Rückbau der mechanischen und elektrischen Neben-Anlagen abgeschlossen. Die Transformatoren werden laut Terminplan in der KW 37 / 2026 abtransportiert werden.
- Swissgrid Unterwerk Lupfig, ist der Rückbau der mechanischen und elektrischen Anlagen im Gange.

In Zone 4

- ist der Rückbau der Treibstofftanks und der dazugehörigen Rohranlagen in Gange und wird bis Ende August abgeschlossen sein.
- Die Betonwände der Tankanlage wurden teilweise abgebrochen, um den Zugang zu den Reservoirs zu ermöglichen.

Zone 1 Stand des Rückbaus

Planung der Rückbauaktivitäten der Wasseraufbereitungsanlage

Mai 26	Mai 26	Mai /Juni 26	Aug. 26	Sep. 26	Okt. 26	Nov. 26
Außerbetriebnahme	Demontage der Module	Rückbau der Tankanlage	Rückbau der Fundamente	Parkplatzbau	Parkplatzbau	Begrünung
Abgeschlossen	Abgeschlossen	Abgeschlossen	Abgeschlossen			

Zone 2 Stand des Rückbaus

Planung der Rückbauaktivitäten der 8 Gas-Turbinen-Generatoren Einheiten und der Schallschutzwand.

Mai 26	Jun / Juli 26	Juni / Juli 26	Aug. 26	Sep. 26	Okt. 26	Nov. 26	Dez. 26
Außerbetriebnahme	Demontage der Module und Kamine	Abtransport der GTG-Module	Demontage der Schallschutzwandelemente	Rückbau Stahlstruktur	Rückbau Fundamente	Parkplatzbau	Begrünung
Abgeschlossen	Kamine der 8 Einheiten sind demontiert	GTG-Module Abgeschlossen	Im Gange				

Zone 3 Stand des Rückbaus

Planung der Rückbauaktivitäten der 4 Transformatoren

Mai 26	Juni 26	Jul. 26	Aug. 26	Sep. 26	Okt. 26	Nov. 26	Dez. 26
Außerbetriebnahme	Demontage der Kabeltrassen	Demontage / Abtransport der Transformatoren	Rückbau des Swissgrid Unterwerks Lupfig	Rückbau der Betonwände	Rückbau Fundamente	Aufschütten Nivellieren	Begrünung
Abgeschlossen	Abgeschlossen	Transportvorbereitungen Im Gange	Im Gange				

Zone 4 Stand des Rückbaus

Planung der Rückbauaktivitäten der Flüssig-Brennstoff-Reservoirs und der Ölförderanlagen

Mai 26	Juni 26	Juni / Juli 26	Aug. 26 / Sep. 26	Okt. 26	Nov. 26	Dez. 26
Außerbetriebnahme	Demontage der Module	Abtransport der Module	Demontage der Brennstofftanks	Rückbau Fundamente	Aufschütten Nivellieren	Begrünung
Abgeschlossen	Abgeschlossen	Abgeschlossen	Im Gange			

Die Projektleitung der TRPP Birr Anlage steht ihnen für Fragen zu diesen Rückbau-Aktivitäten zur Verfügung und kann wie folgt kontaktiert werden:

GE Vernova, Projektleitung

Zentralstrasse 40

5242 Birr

René Schertenleib

Tel. 058 505 71 12
