

Informationen zum Rückbau des Temporären Reservekraftwerks - Oktober 2026


12. Oktober 2026

Information der GE Vernova über die Rückbauphase der Anlage TRPP Birr - Oktober 2026

Der Rückbau der Anlage TRPP Birr begann am 1. Mai 2026 und wird voraussichtlich Ende Dezember 2026 abgeschlossen sein.

Die Abbrucharbeiten der TRPP-Anlage verlaufen planmässig und entsprechend dem Abbruchzeitplan. Der Gesamtfortschritt der Abbrucharbeiten ist nachstehend nach Zonen aufgeschlüsselt dargestellt.

Lageplan Zonen 1 – 4 der Rückbauaktivitäten der TRPP Birr Anlage

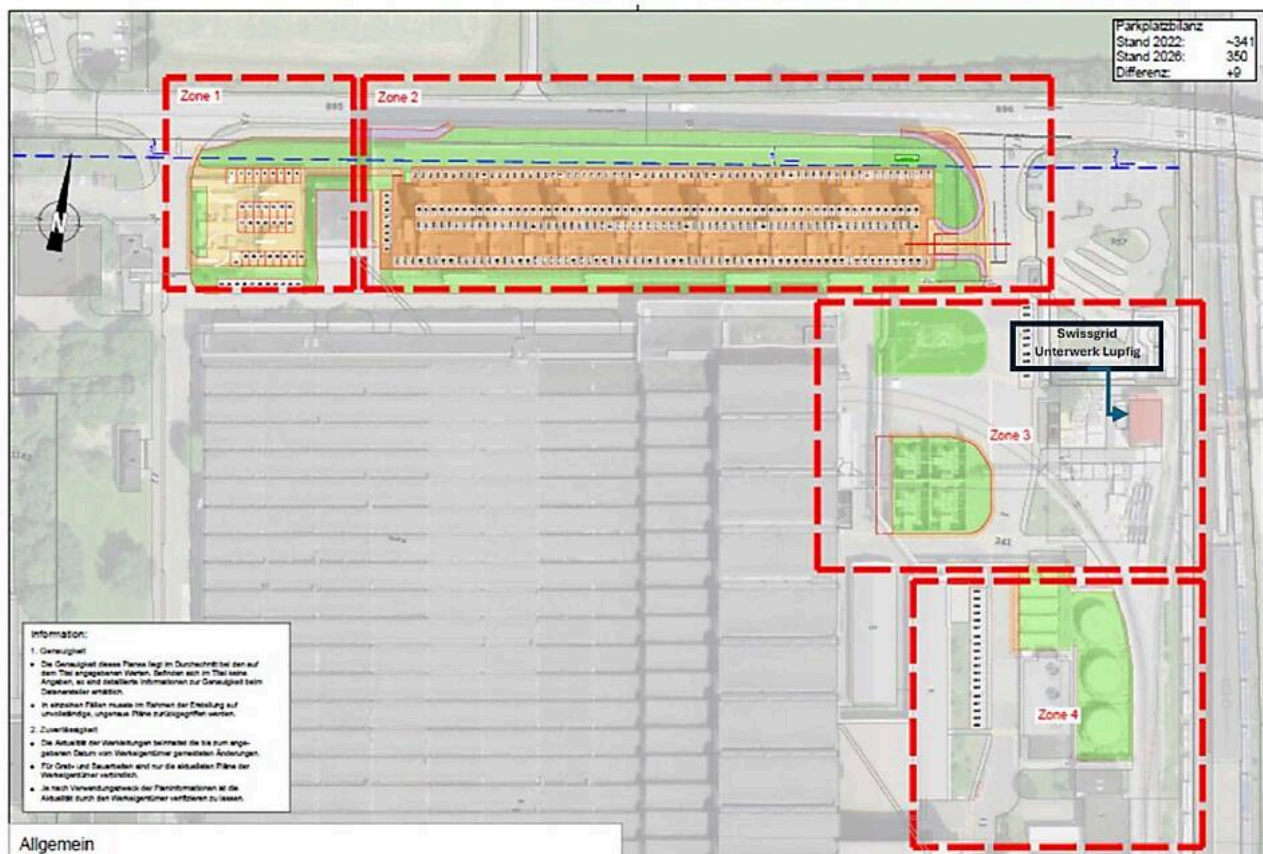

Zone 1

Die baulichen Sanierungsarbeiten im Bereich der Wasseraufbereitungsanlage sind abgeschlossen. Die Markierung der neuen Parkplätze in dieser Zone wurde ausgeführt. Der Fahrradunterstand gegenüber dem Haupteingang des GEV-Werkareals wurde errichtet. Die Freigabe zur Nutzung des Parkfeldes ist im November geplant.

Zone 2

Im Bereich der Gas-Turbinen-Generatoren Einheiten, ist der Rückbau der Schallschutzmauer, sowie das Entfernen der Fundamente entlang der Kantonsstrasse, abgeschlossen. Des Weiteren werden in dieser Zone die Fundamente der Gas-Turbinen-Generatoren entfernt. Die Abbrucharbeiten in dieser Zone werden voraussichtlich Anfang November abgeschlossen sein.

Temporäre Verkehrsregelungen im Bereich der Zonen 1 & 2 (Entlang der Lärmschutzwand)

Die vorübergehende Verkehrsumleitung (Strassen-Verengung) im Zonenbereich 1 & 2 entlang der Schallschutzwand, wird wie geplant, Ende der KW 45 / 2026 entfernt werden.

Zone 3

Im Transformatorenbereich ist der Rückbau der mechanischen und elektrischen Anlagen abgeschlossen. Die Transformatoren wurden in der KW 38 / 2026 entfernt.

Die mechanischen und elektrischen Demontagearbeiten des Swissgrid Umspannwerks Lupfig sind im Gange.

Zone 4

Der Rückbau, der Treibstofftanks und der dazugehörigen Rohranlagen, ist abgeschlossen.

Die Abbrucharbeiten der Betonfundamenten der Tankanlage sind im Gange und werden voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein.

Die Projektleitung der TRPP Birr Anlage steht ihnen für Fragen zu diesen Rückbau-Aktivitäten zur Verfügung und kann wie folgt kontaktiert werden:

GE Vernova, Projektleitung

Zentralstrasse 40

5242 Birr

René Schertenleib

Tel. 058 505 71 12
